



## ACTA

### “PROGRAMA TRANSFERENCIA RESTAURACIÓN EMERGENCIA EX OFICINA SALITRERA CHACABUCO” CÓDIGO BIP 40038278-0.

Tema: 4° Reunión Comité Director - octubre 2023

17/10/2023. Vía telemática. Inicio 17:00 h. enlace

Fecha: <https://us06web.zoom.us/j/89217293790?pwd=WUdYMEhiQldMNGEyN3ROTfhyZVVGQT09>

#### Alcance y puntos tratados:

La reunión es convocada por Fundación Altiplano, para realizar la cuarta reunión del Comité consultor del programa "Transferencia Restauración Emergencia Ex Oficina Salitrera Chacabuco" código BIP: 40038278-0.

Asisten a la reunión, los integrantes del comité cumpliendo el quórum mínimo para dar inicio a la sesión.

Los participantes fueron: Rodrigo Gutiérrez y Hugo Pizarro en representación del Gobierno Regional; Jorge Díaz, de la corporación Museo del Salitre Chacabuco; Juan Botto, Corporación Memoria Chacabuco; Victoria López, en representación de la Municipalidad de Sierra Gorda; Sergio Alfaro y Claudio Ostría, Arquitectos UCN; Yaritza Aguirre, Lucía Otero, Irving Sánchez y Marcia Reumante, de Fundación Altiplano.

A continuación se presentan los siguientes temas:

1. Actualización objetivos Gobernanza - Estructura
2. Avance Escuela Taller de obra (Empleo + Aprendizaje)
3. Visita a obra de emergencia el día 26 de agosto.
4. Invitación al Taller 04: Propuesta de Restauración sostenible del Teatro y entorno.
5. Estado de avance de obra.

Lucía Otero, da la bienvenida a reunión, informando pauta y temas a tratar.

Irving Sánchez, realiza presentación del PPT, haciendo resumen de como va el programa.

Lucía Otero, informa los avances de Carta Gantt a la fecha, tiempos estimados de cierre de actividades, situación actual con respecto a permisos CMN y DOM de la obra de emergencia.

Informa sobre la próxima mesa técnica a realizar



Lucía Informa que aún no hemos tenido respuesta de CMN, pese a que se ha mandado todo, las respuestas no han sido tan aceleradas.


Irving Sánchez, informa sobre el componente de Escuela Taller en Obra y Escuela de Conservación Chacabuco. Comentando cómo se desarrollaron las escuelas en obra, con sus respectivas fotografías. Asimismo, informó del taller de este viernes 20 de octubre de la escuela de conservación.

Marcia Reumante, informa sobre cambios las fechas tentativas para las próximas escuelas. Definidas preliminarmente, para los viernes 10 y 24 de noviembre.

Relación de asistentes:

Nº	Nombre	Organización
1	Juan Botto	Corporación memoria de Chacabuco
2	Victoria López	Municipalidad de Sierra Gorda
3	Jorge Díaz	Corporación Museo del Salitre Chacabuco
4	Claudio Ostria	Arquitecto UCN
5	Sergio Alfaro	Arquitecto UCN
6	Hugo Pizarro	Fundación Altiplano
7	Rodrigo Gutiérrez	Fundación Altiplano
8	Lucía Otero	Fundación Altiplano
9	Irving Sánchez	Fundación Altiplano
10	Marcia Reumante	Fundación Altiplano
11	Yaritzza Aguirre	Fundación Altiplano

Pantallazos de la reunión:

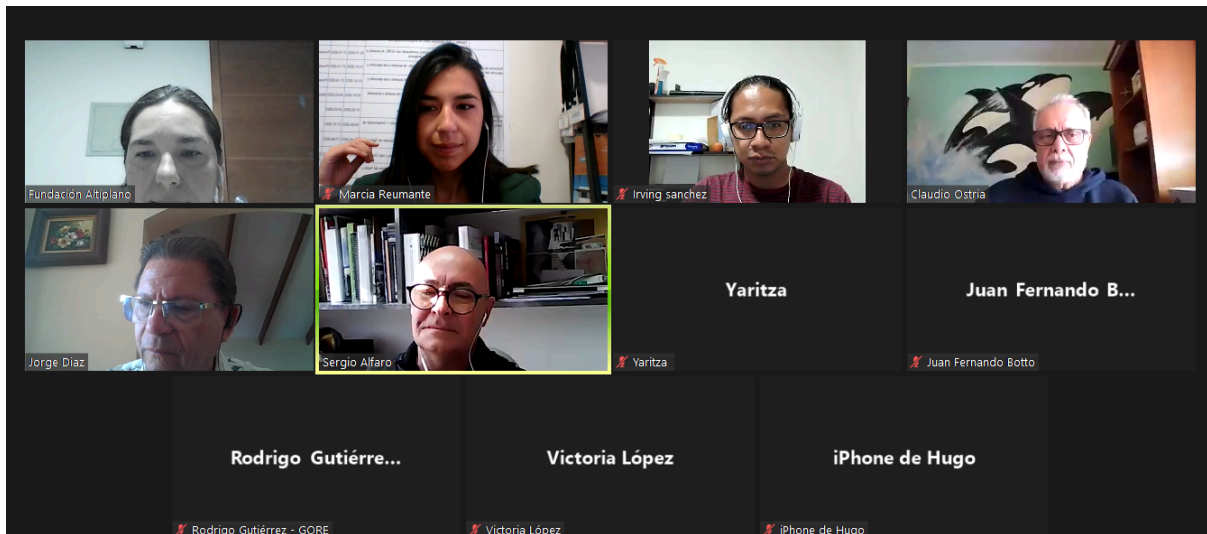


**ACTIVIDADES DEL PROGRAMA**

**OBJETIVO 2. APRENDIZAJE COMPARTIDO**

A continuación, el avance de los talleres

N°	Actividades	Fecha	Lugar	% Avance	Estado
A14	Planificación de escuela taller de acuerdo a propuesta aprobada	24/3/2023		100%	Ejecutado
A15	Taller para Instalación de faenas	10/08/2023	Chacabuco	100%	Ejecutado
A16	Taller para Desarmes + catalogación + Conservación de elementos patrimoniales	11/08/2023	Chacabuco	100%	Ejecutado
A17	Taller para Apuntalamientos y Protección de Teatro	10/10/2023	Chacabuco	100%	Ejecutado
A18	Taller de Valor Patrimonial del Teatro y sitio Chacabuco	22/4/2023	Chacabuco	100%	Ejecutado
A19	Taller de Daños y Estado de Conservación del Teatro y entorno	20/5/2023	UCN	100%	Ejecutado
A20	Taller Propuesta de Restauración sostenible del Teatro y entorno	20/10/2023	H. Antofagasta	50%	En proceso
A21	Taller Modelo de Gestión: actualización de plan de manejo y gestión del sitio Chacabuco	10/11/2023	Por confirmar	0%	En proceso
A22	Taller Estrategia Conservación Sostenible Paisaje Salitrero Sierra Gorda	24/11/2023	Por confirmar	0%	En proceso
A23	Taller formulación de perfiles de inversión para Paisaje Salitrero Sierra Gorda, según estrategia	17/06/2023	Chacabuco	100%	Ejecutado

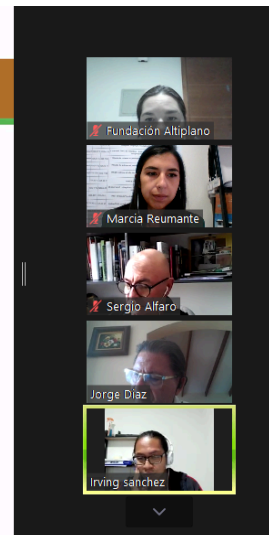



**CORE**  
Consejo Regional  
REGION DE ANTOFAGASTA

